



SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Blw

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 9, Rue des
Renoncules - 1300 Limal.

PROPRIETAIRE

Adresse : M

DEMANDEUR :

Adresse : BINATE DOMINIQUE

INSTALLATEUR : 1060 BRUXELLES

Adresse : 17, Rue Jean Robie

TVA ou CI : BE : 0553-426-075

EAN : Région de waver
Ref.: Bih Compteur n° 2377191
Index : 113697,5 - 47346,2 kWh

Date du contrôle : 24/11/2010 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : habitation

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement 63 A

Câble aliment, tableau. princ. : 2 x 16(2) mm² Inter.gén. : type Δ63A/0,3A (2)

Type électrode de terre : boucle - barres piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term 20 + 12 ; RA : 6,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION :

Voir schéma unifilaire et de position

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : Néant

Note : Bandoaux lumineux salle de bain - remplacer par
appareillage IPX4

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

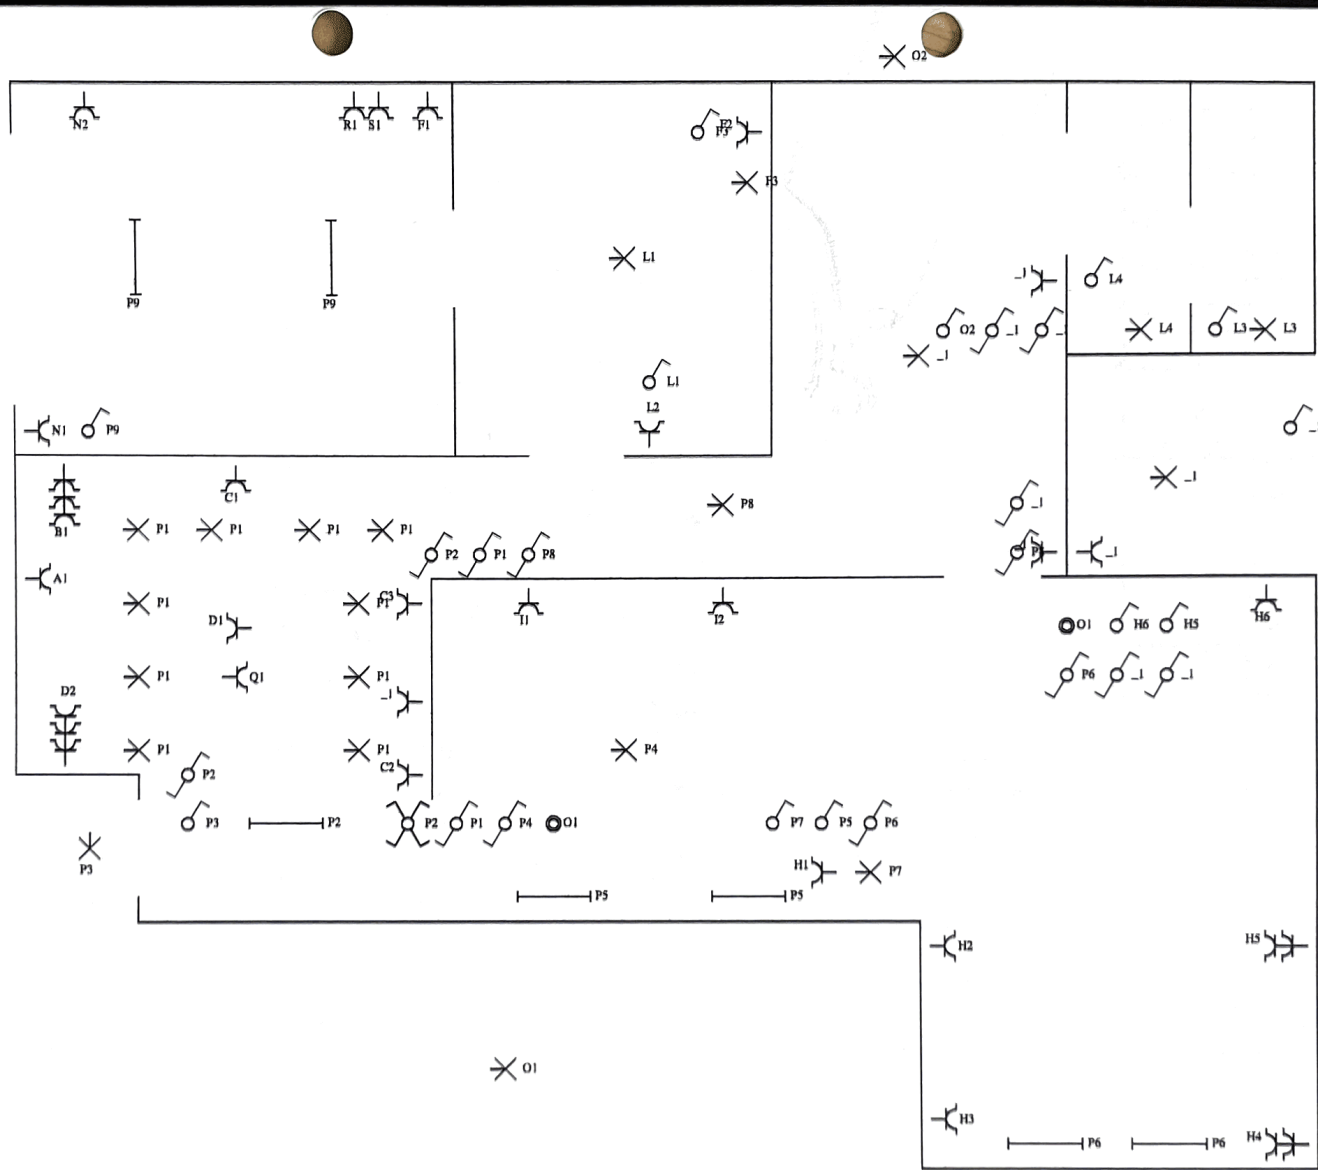
CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCOR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/11/2035 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

90 P. Wallelet




Le directeur,

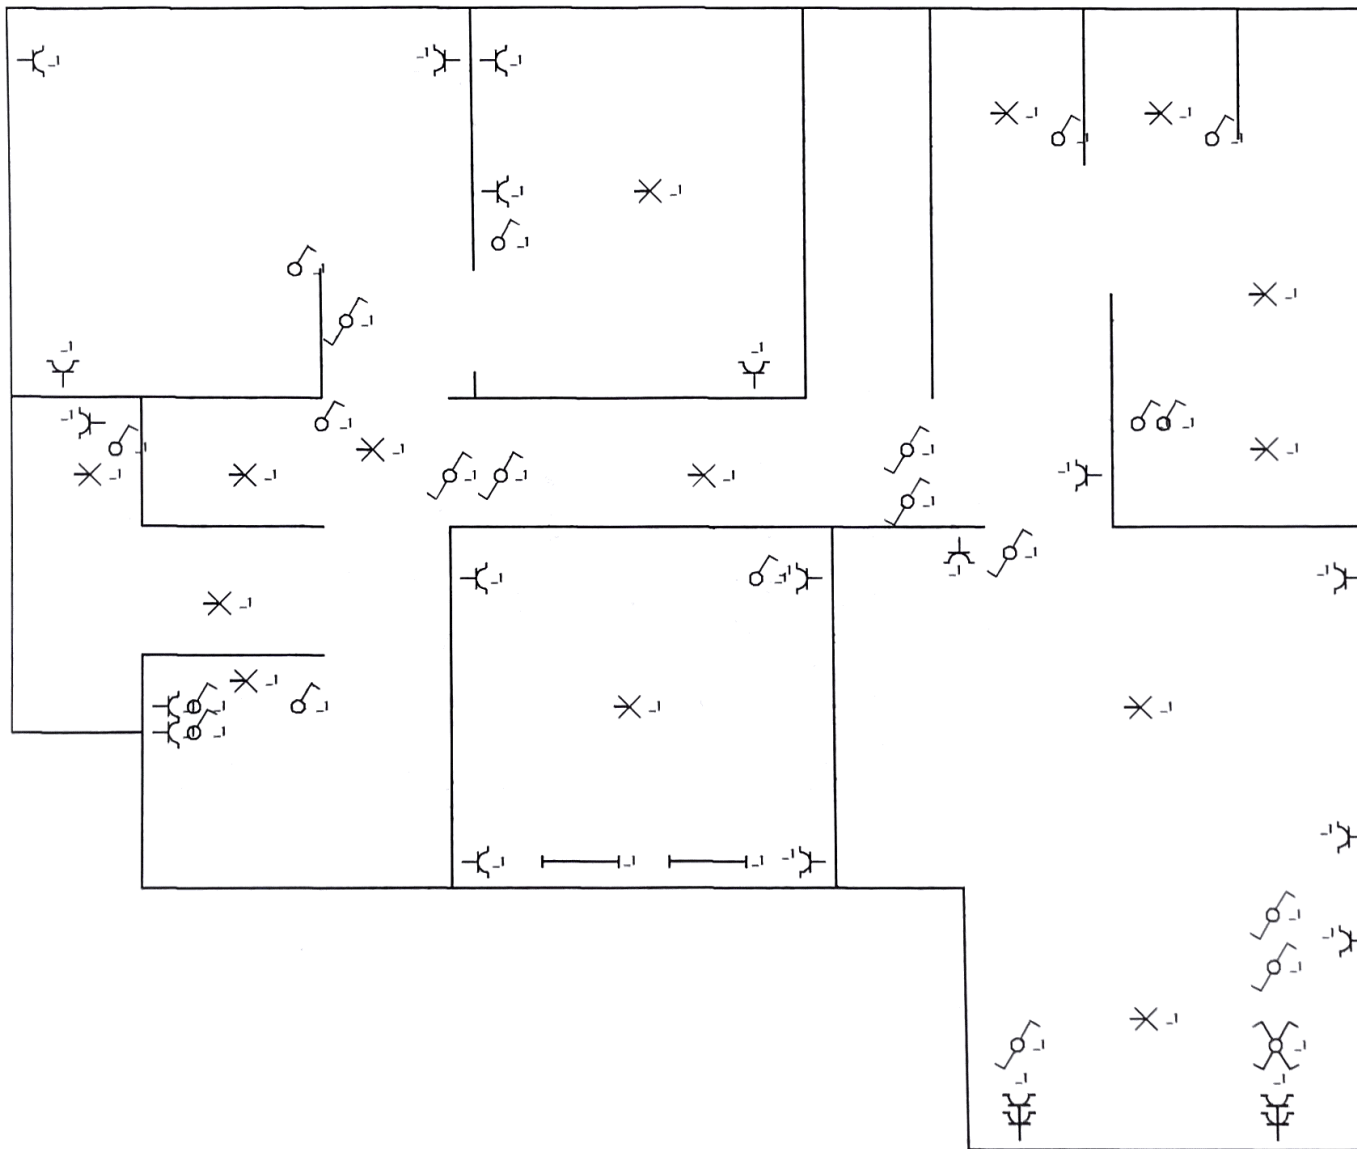
[Signature]



Rez-de-chaussée





Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Binamé BTW / TVA 0553.424.076 Datum/Date 24-11-2010 Handtek/Sign 	Organis. - BTW Naam/Nom - waltelut 190 Datum/Date 24/11/2010 Handtek/Sign 	Naam/Nom Rigo Marcks Straat/Rue Avenue des Renoncules, 9 Gemeen/Comm 1300 Limal Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541

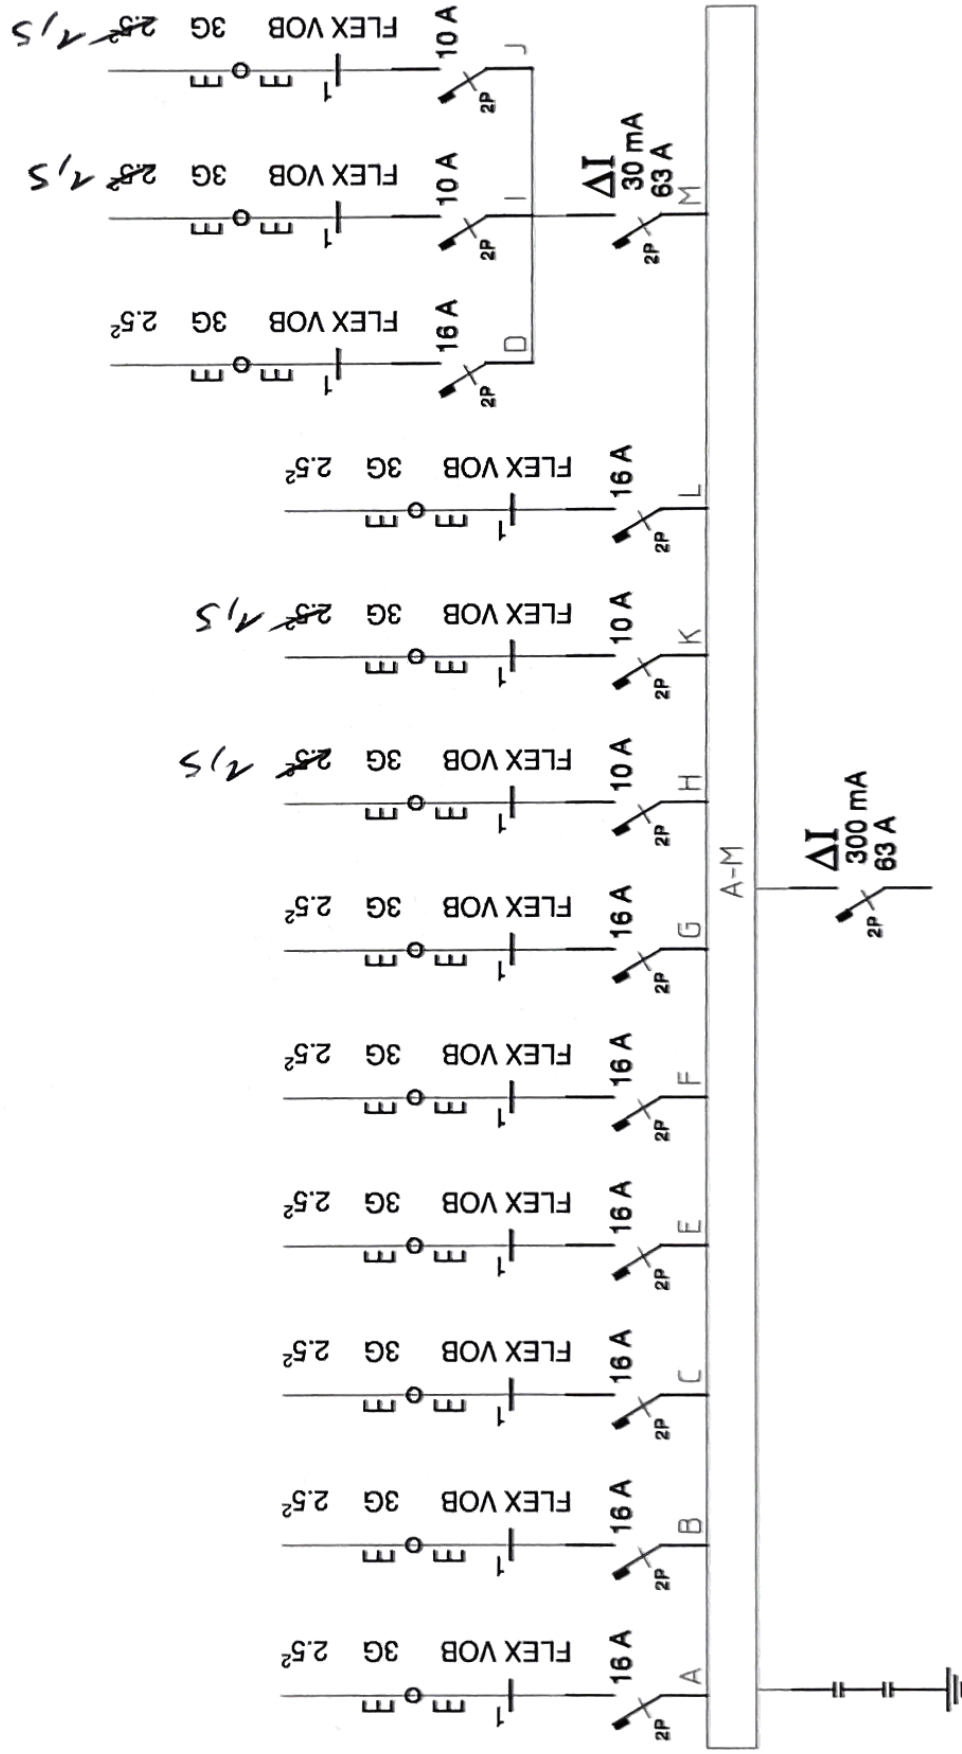


1er





Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V
Naam/Nom Binamé BTW / TVA 0553.424.076 Datum/Date 24-11-2010 Handtek/Sign 	Organis. - BTU Naam/Nom - Wathelak / 90 Datum/Date 24/11/2010 Handtek/Sign 	Naam/Nom Rigo Marcks Straat/Rue Avenue des Renoncules, 9 Gemeen/Comm 1300 Limal Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541

Tableau



Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Binamé BTW / TVA 0553.424.076 Datum/Date 24-11-2010 Handtek/Sign 	Organ. : BTW Naam/Nom : Wettelek/90 Datum/Date 24/11/2010 Handtek/Sign 	Naam/Nom Rigo Marcks Straat/Rue Av des renoncules 9 Gemeen/Comm 1300 Limal Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541
